



Por tu seguridad

LA NUEVA LÍNEA 1

Atención a usuarios y
trabajos de obra



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




MOVILIDAD
INTEGRADA

19 de julio de 2022



- Operación: 11 trenes
- Intervalo de paso: 3 minutos
- Ocupación máxima 80% (18:00 h)
- 159.6 mil pasajeros (18.jul.22)

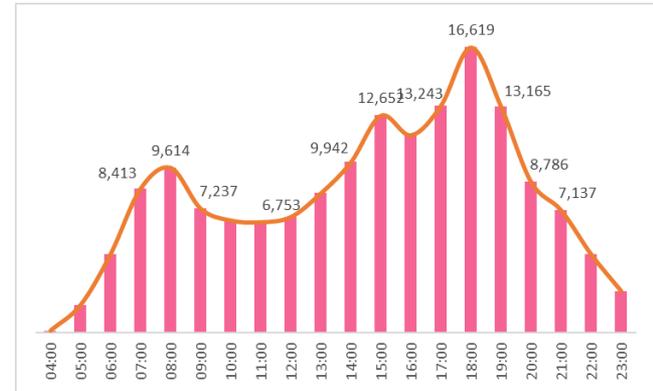


LÍNEA



Pantitlán – La Paz



- Operación: 14 trenes
- Intervalo de paso: 4 minutos
- Afluencia máxima 90% (07:00 h)
- 303 mil pasajeros (18.jul.22)

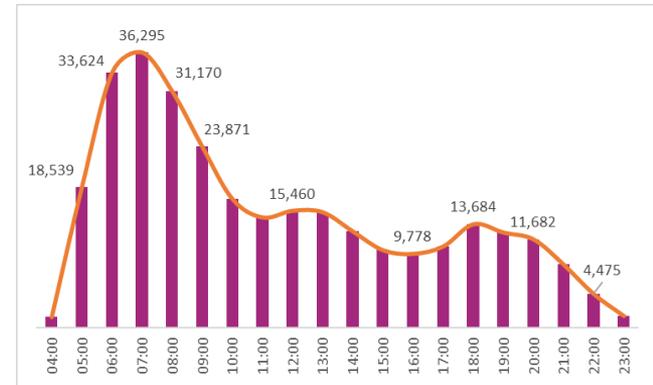


LÍNEA



Pantitlán - Tacubaya



- Operación: 26 trenes
- Intervalo de paso: 2:10 minutos
- Ocupación máxima 90% (18:00 h)
- 296 mil pasajeros (18.jul.22)

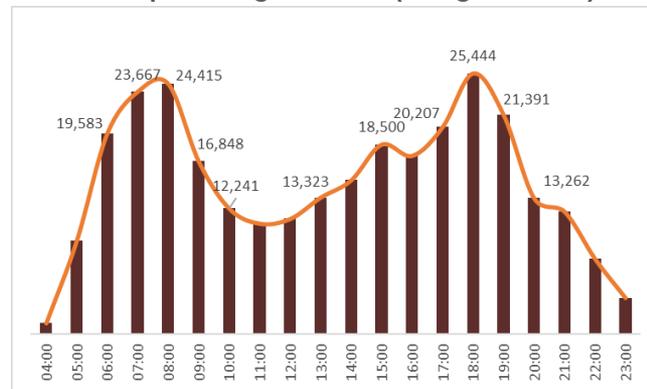


LÍNEA



Pantitlán - Politécnico




- Operación: 14 trenes
- Intervalo de paso: 4 minutos
- Ocupación máxima 80% (07:00h)
- 156 mil pasajeros (18.jul.22)

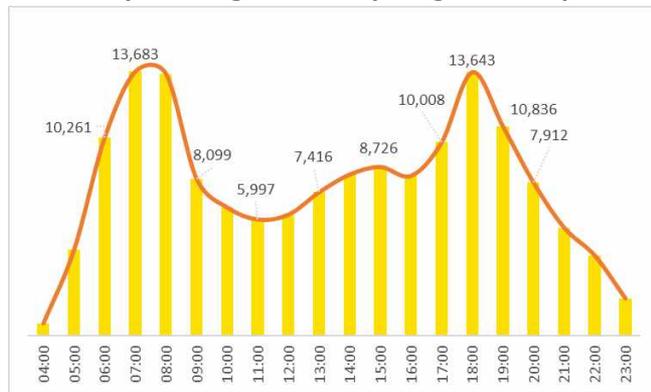



- Operación: 14 trenes
- Intervalo de paso: 4 minutos
- Afluencia máxima 85% (07:00 h)
- 329.7 mil pasajeros 18.jul.22)

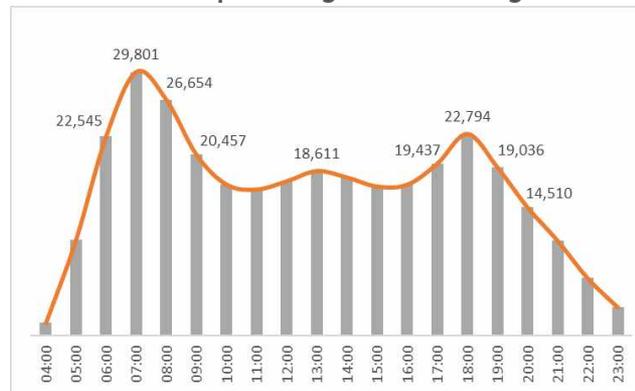



TRABAJOS TÚNEL INTERESTACIÓN BALDERAS – SALTO DEL AGUA

- Maquinaria ferroviaria especializada para retiro de materiales en operación.



TRABAJOS TÚNEL INTERESTACIÓN BALDERAS – SALTO DEL AGUA

- Retiro de barra guía.



TRABAJOS TÚNEL INTERESTACIÓN BALDERAS – SALTO DEL AGUA

- Trabajos para ventilación.
- Zona estratégica para ingreso de materiales que permitirán cambio de vía.



AVANCE GENERAL

Soportes provisionales de redes activas

Salto del Agua – Pantitlán

- 13,082 armellas a cada 3 m
- 627 trapecios en bajo andén

= CONCLUIDO =








AVANCE GENERAL

Corte de vía Z

Balderas - Salto del agua

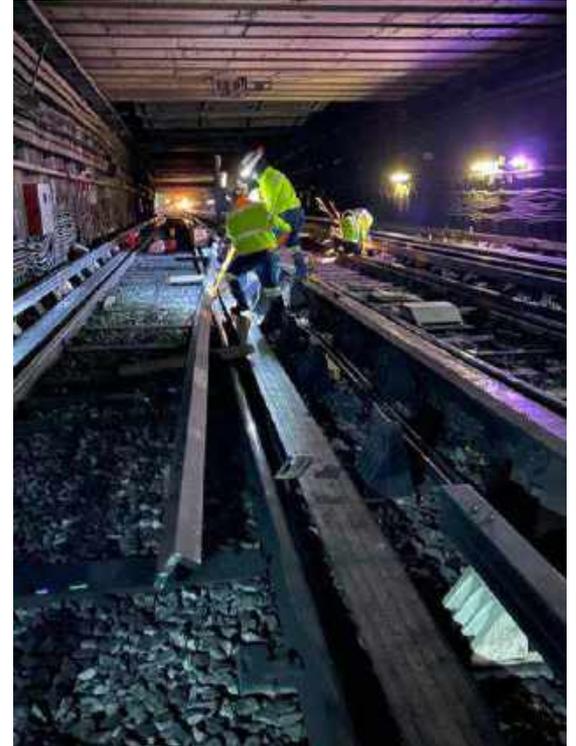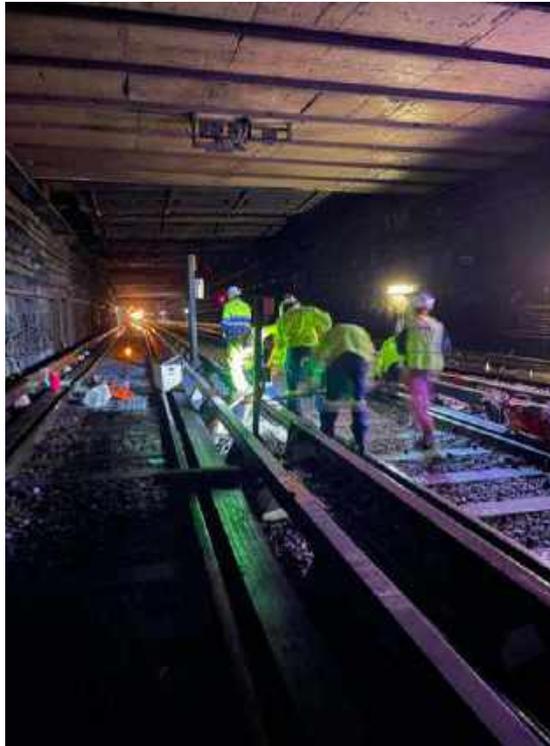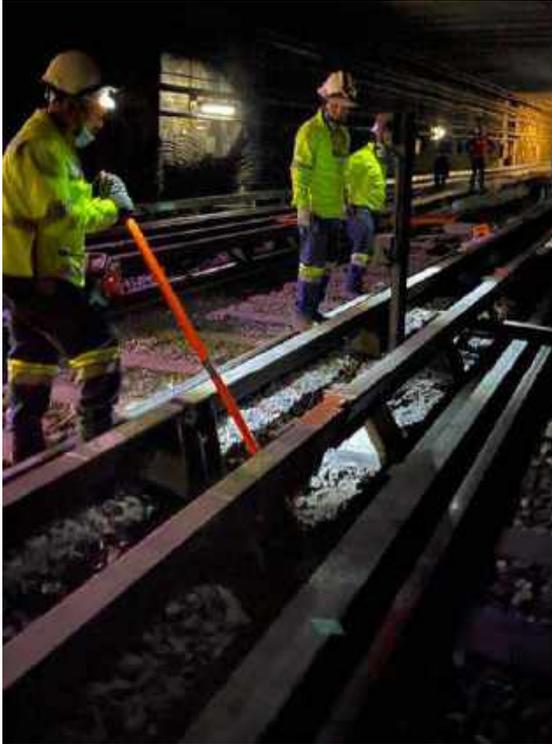

AVANCE GENERAL

Retiro de elementos y bandejas de cables de baja tensión

TRABAJOS RETIRO DE OTROS ELEMENTOS SITUADOS EN
BANDEJAS DE BT

| Elemento | Cantidad |
|---|----------|
| Ménsulas (Ud) | 3,343.00 |
| Soportes verticales (Cremalleras) (Ud) | 3,037.00 |
| Luminarias no operativa (Ud) | 578.00 |
| Contactos monofásicos y trifásicos (Ud) | 188.00 |
| Reflector (Ud) | 6.00 |
| Curvas de bandeja (Ud) | 32.00 |
| Retiro de cable de BT cal. 8 AWG (m) | 532.00 |
| Retiro de cable de BT cal. 10 AWG (m) | 212.40 |

TRABAJOS RETIRO DE BANDEJA DE CABLES DE BT

| Frente | Interestación | Vía | Longitud (m) |
|--------|-------------------------|-----|--------------|
| 1 | Pantitlán - Zaragoza | 1-2 | 2,871.35 |
| 2 | Salto del Agua-Zaragoza | 1-2 | 10,016.46 |
| TOTAL | | | 6,878.73 |





AVANCE GENERAL

Retiro de tapiz de pilotaje automático P-135

Balderas - Salto del Agua – Isabel La Católica

- 1,210 metros retirados






AVANCE GENERAL

Retiro de módulos de vía

Balderas - Salto del Agua – Isabel La Católica

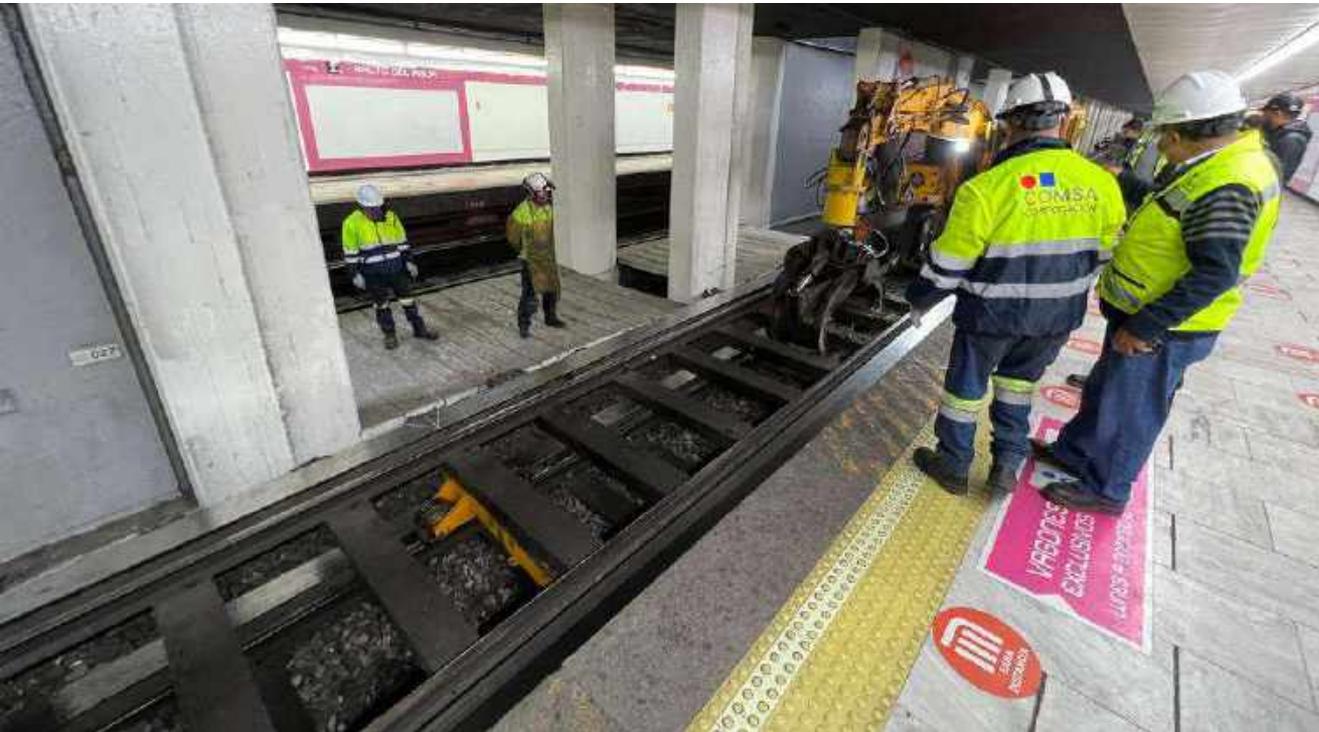



AVANCE GENERAL



29 trenes nuevos

- Los más modernos del país.
- Fabricación de cabeza de serie concluida
- Control de pilotaje basado en comunicaciones (CBTC)
- Capacidad para 2,252 usuarios.
- Espacios para usuarios en silla de ruedas.
- Pantallas informativas
- Sistema de detección de fuego.
- Sistemas de tracción-frenado y generación de energía eléctrica.



Por tu seguridad

LA NUEVA LÍNEA 1



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MOVILIDAD
INTEGRADA
